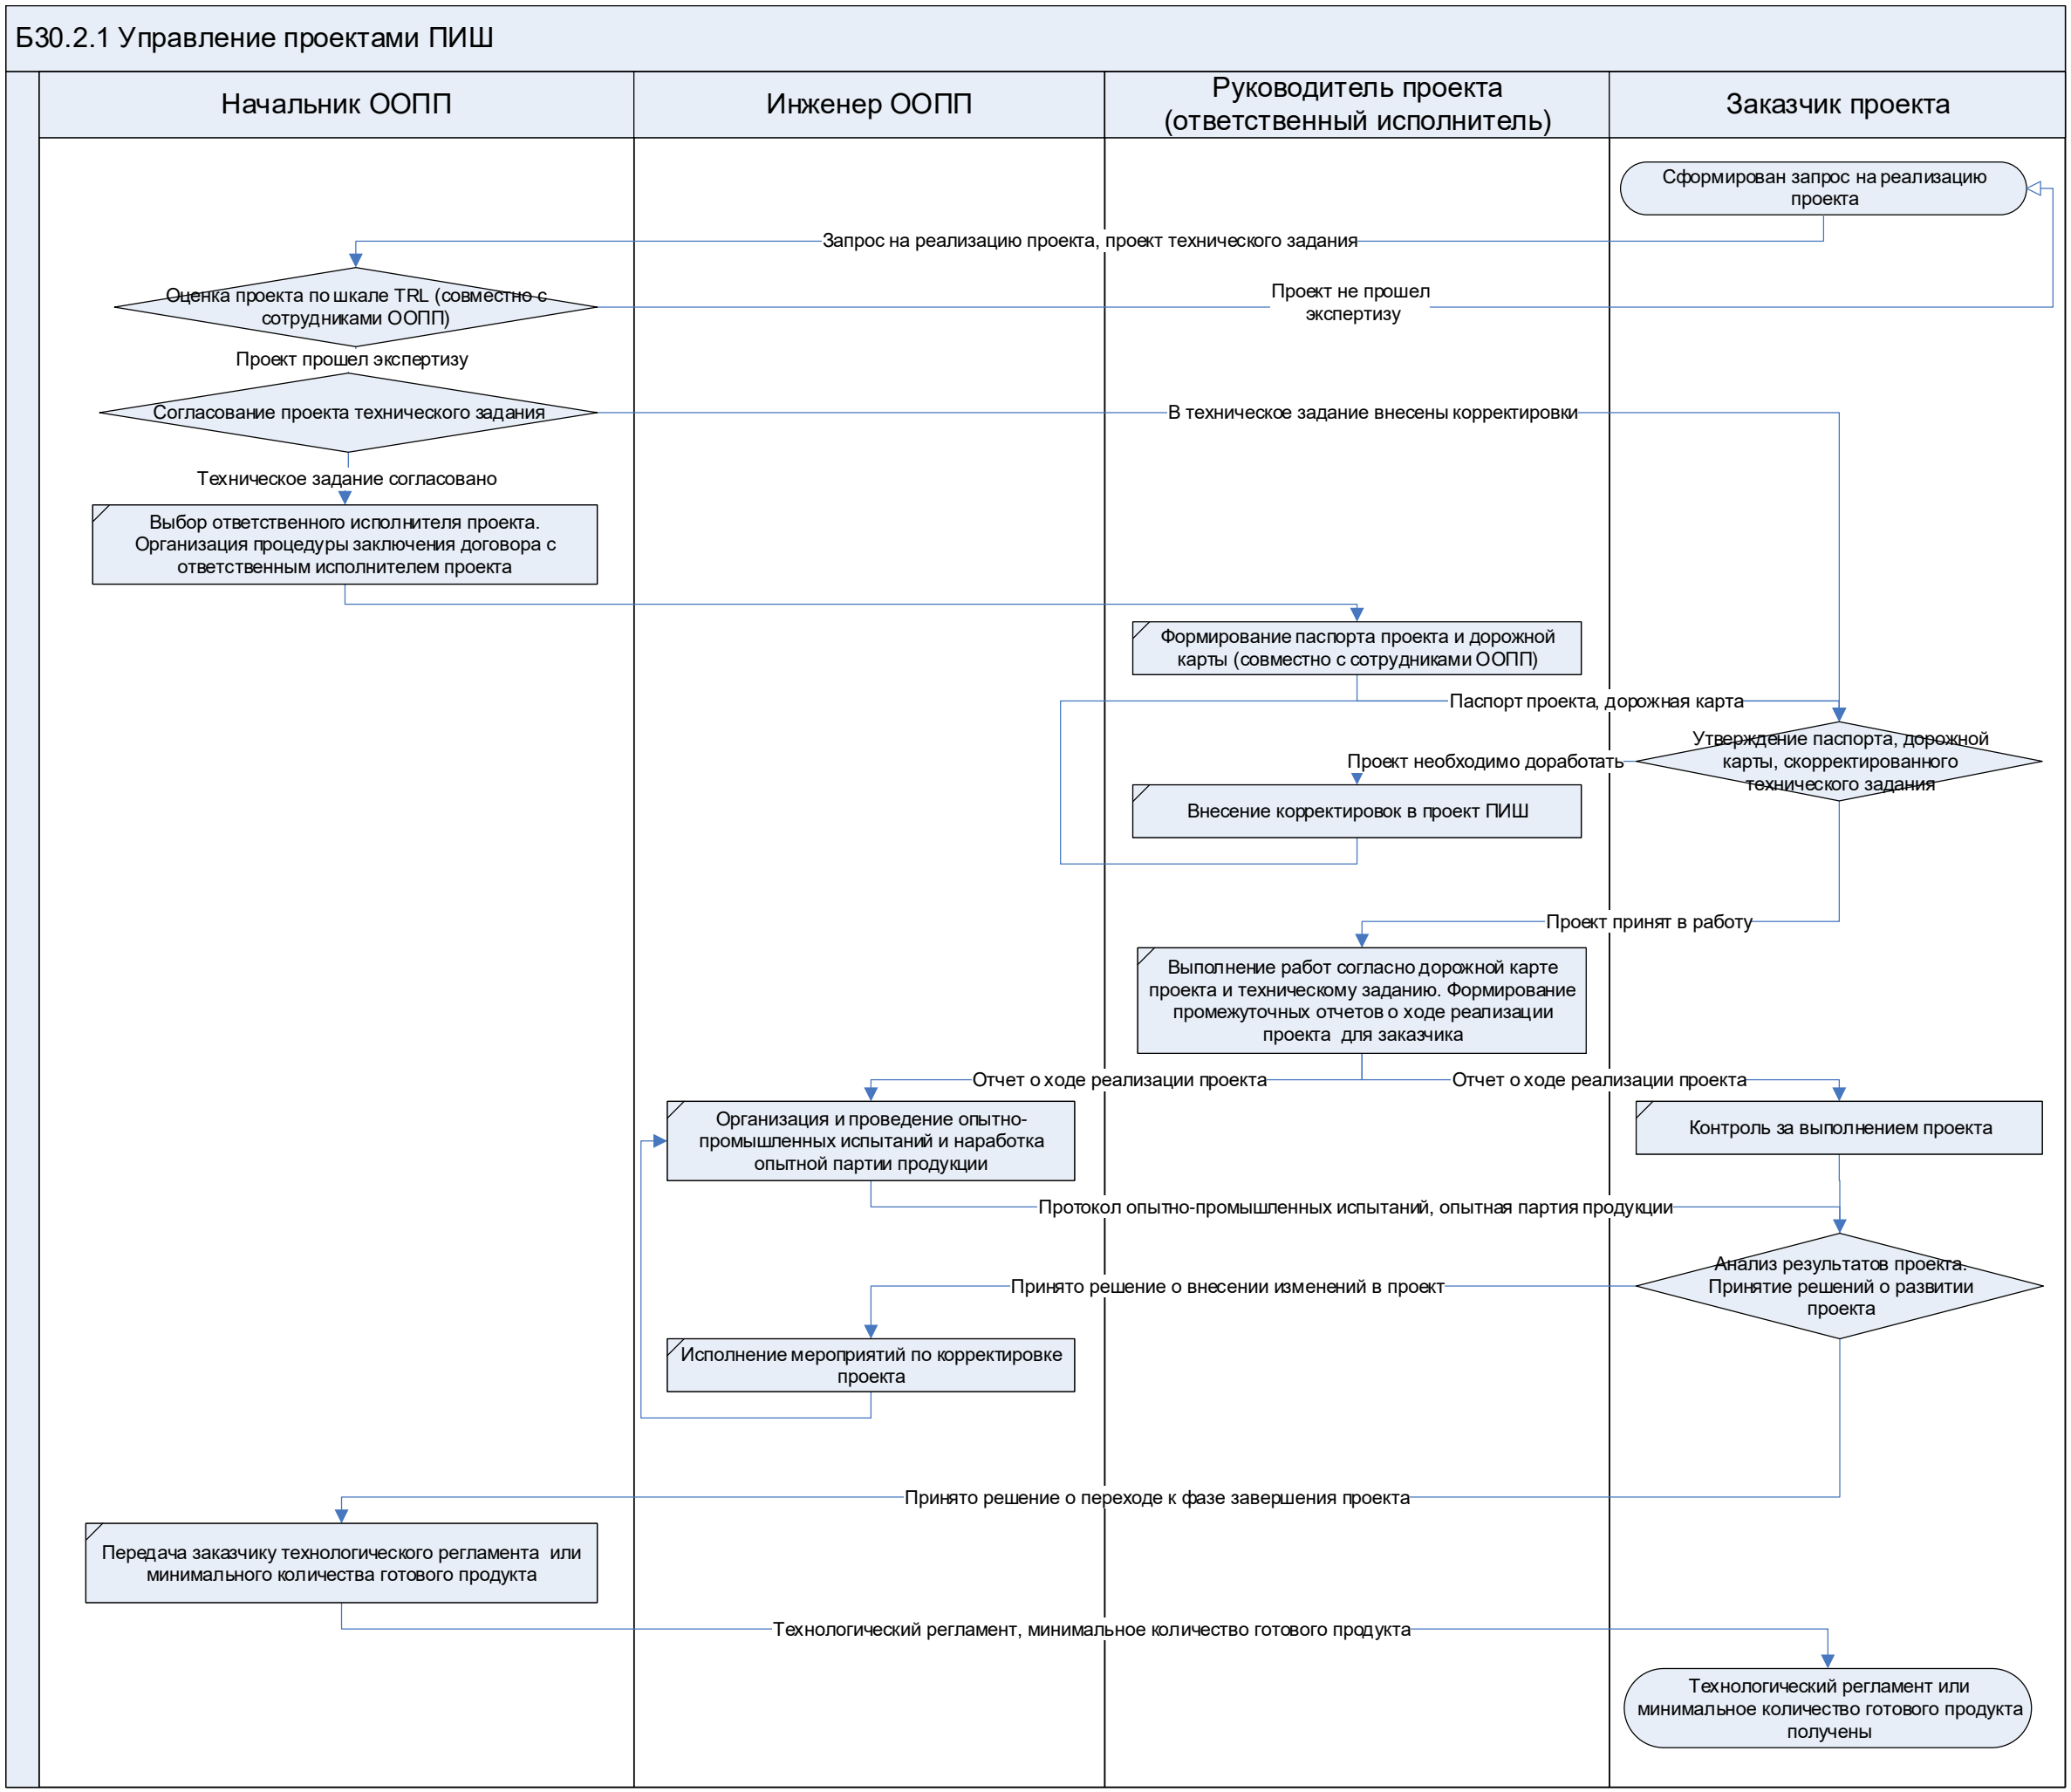
Б30.2.1 Управление проектами ПИШ
Начальник ООПП
Инженер ООПП
Руководитель проекта (ответственный исполнитель)
Заказчик проекта
Сформирован запрос на реализацию проекта
Запрос на реализацию проекта, проект технического задания
Оценка проекта по шкале TRL (совместно с сотрудниками ООПП)
Проект не прошел экспертизу
Проект прошел экспертизу
Согласование проекта технического задания
В техническое задание внесены корректировки
Техническое задание согласовано
Выбор ответственного исполнителя проекта. Организация процедуры заключения договора с ответственным исполнителем проекта
Формирование паспорта проекта и дорожной карты (совместно с сотрудниками ООПП)
Паспорт проекта, дорожная карта
Утверждение паспорта, дорожной карты, скорректированного технического задания
Проект необходимо доработать
Внесение корректировок в проект ПИШ
Проект принят в работу
Выполнение работ согласно дорожной карте проекта и техническому заданию. Формирование промежуточных отчетов о ходе реализации проекта для заказчика
Отчет о ходе реализации проекта
Отчет о ходе реализации проекта
Организация и проведение опытно-промышленных испытаний и наработка опытной партии продукции
Контроль за выполнением проекта
Протокол опытно-промышленных испытаний, опытная партия продукции
Анализ результатов проекта. Принятие решений о развитии проекта
Принято решение о внесении изменений в проект
Исполнение мероприятий по корректировке проекта
Принято решение о переходе к фазе завершения проекта
Передача заказчику технологического регламента или минимального количества готового продукта
Технологический регламент, минимальное количество готового продукта
Технологический регламент или минимальное количество готового продукта получены
